Carretera Áfricam – Tecali de Herrera

Puebla

Descripción:



Modernización y ampliación a 18.0 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 1.0 metros, internos de 0.5 metros y faja separadora central de 1.0 metro incluye dos puentes vehiculares ubicados en los kilómetros 1+087.23 de 32.0 metros y 8+933.55 de 45.28 metros y entronque a nivel "Cuautinchán" ubicado en el Km 9+300.



Beneficios:


- Ahorro en tiempo: 40 minutos
- TDPA: 5.773
- Población beneficiada: 1,445,984 habitantes los municipios de Puebla, Cuautichán y Tecali de Herrera.



Empleos Generados:

• Directos: 1,673

• Indirectos: 6,692



Inicio de Obra
JUL-2014
Inicio de Operación
OCT-2024

Preinversión (tramos o trabajos con factibilidades abiertas)	Ejecución
Liberación del Derecho de Vía por los municipios de Puebla y Cuautinchán	Km 0+000 – Km 4+400 Km 8+400 – Km 9+400

Decisiones clave

• Tramitar con los municipios de Puebla y Cuautinchán la liberación del derecho de vía.

	Alcance	Qué se ha hecho	Cuánto falta por hacer	
Meta	 19.0 KM 4 Puentes 1 Entronque a nivel 7 Pasos inferiores Peatonales 6 Pasos superiores vehiculares. 	 13.6 KM 2 Puentes 7 Pasos inferiores Peatonales 6 Pasos superiores vehiculares 	5.4 KM2 Puentes1 Entronque a nivel	
Inversión (mdp)	475.0	235.0	240.0	
Tiempo (meses)	15 meses	7 meses	8 meses	


Carretera Áfricam – Tecali de Herrera

Puebla

Factibilidades

	Tipo	Dependencia/ Área que expide/autoriza	Autoriza do	Fecha de obtención	Aspectos Relevantes
Técnica	Proyecto Ejecutivo	CENTRO SCT	Proceso	30-nov-2023	En proceso de actualización por parte del Centro SCT y se pretende obtener la validación en el mes de noviembre de 2023.
Económica	Registro en cartera	SHCP	No	31-ene-2024	Ya contaba con Registro en Cartera No. 14096410010, por lo que se lleva cabo la actualización del ACB para darle proyección al Registro en Cartera para el año siguiente
Legal	Derecho de Vía	MUNICIPIOS DE PUEBLA Y CUAUTINCHAN	En proceso	30-nov-2023	Se encuentra en proceso de obtención por parte de los municipios de Puebla y Cuautinchán.
Ambiental	Manifestación de Impacto Ambiental	SEMARNAT	En proceso	31-ene-2024	Se lleva a cabo la actualización a la modificación (ampliación) al plazo originalmente establecido por la SEMARNAT

N	Componente	Ponderación	Programado %	Ejecutado %	Avance Real Global %		
18.	38 KILÓMETROS	96.74%	100.00%	72.18%	69.82%		
41	PUENTES VEHICULARES	0.69%	100.00%	40.82%	0.28%		
1 6	NTRONQUE A NIVEL	1.10%	100.00%	0.00%	0.00%		
7 F	PASOS INFERIORES PEATONALES	0.80%	100.00%	100.00%	0.80%		State F
6 F	PASOS SUPERIORES VEHICULARES	0.68%	100.00%	100.00%	0.68%	1	Jan. 197
		100.00%	100.00%	-	71.58%	Pardinas	-
1	Puebla Maria		(Sa	Tonja in Bal orija	3Z3F-	Cuautinchán Santa Almoloyan Ajaja Alpatláhuac Tecali d Terrera	Ipan 1
	km 0+000	n 0+000 al km	1 4+400 y del 5.4 km	km 8+400 al	km 9+400	2 puentes vehiculares km 1+087.23 y 8+933.55 y entronque a nivel km 9+300	E
1	Del km 4+400 al km 8+400 4.0 km 7 pasos inferiores peatonales y 6 pasos superiores vehiculares En operación En constr			os superiore		2 puentes vehiculares km 9+600 y km 17+800 Por construir Por construir	38.56

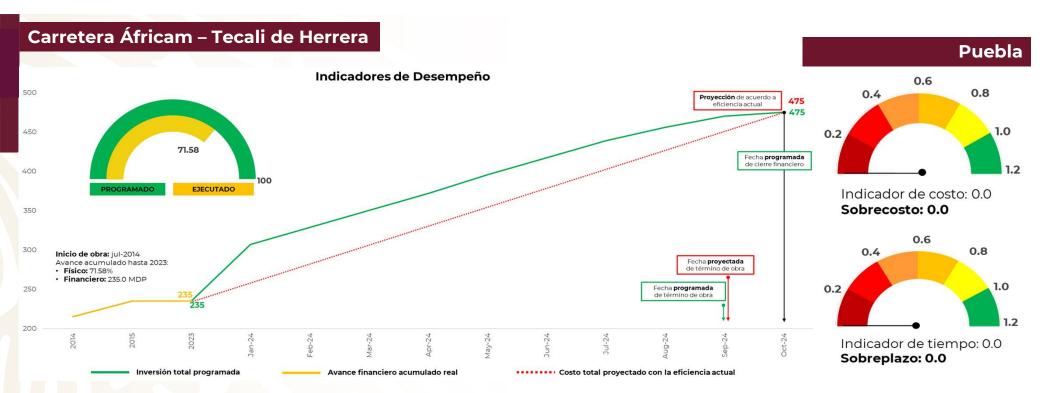

Plan de Recuperación

• La obra no presenta algún retraso.

Decisiones Clave:

• Que los municipios de Puebla y Cuautinchán liberen el derecho de vía del camino.

